CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES

SONDAGEM SPT

Furo	SP 01	Coord. G.Dec	N -16.458724°
Folha	1		O -54.678840°
Prof. (m): 40,00	Revst (m) 8,00	P. do Furo	4,3
Data Inicio:	07/08/2024	Data Final:	10/08/2024
N.A. Inicial:	Seco	N. A. Final:	Seco
Classificado por:			

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
Obra	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)
Local	AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT

Labor. Robson Batista Alves

REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO 1º 15cm	PENETRAÇÃO 2º 15cm	PENETRAÇÃO 3º 15cm	NSPT PRIMEIROS 30cm	NSPT SEGUNDO 30cm	N.A. PROFUND. (m)	PROFUNDIDADE (m)
	TC	-	-	-				1
		12	12	12	24	24		
	AM	10	8	8	18	16		2
		8	8	8	16	16		3
	AM	22	24	30	46	54		4
								5
	AM							6
								7
	AM							8
								9
	AM							10
								11
	AM							12
								13
	AM							14
								15
	AM							16
								17
	AM							18
								19
	AM							20
								21
	AM							22
								23
	AM							24
								25
	AM							26
								27
	AM							28
								29
	AM							30
								31
	AM							32
								33
	AM							34
								35
	AM							36
								37
	AM							38
								39
	AM							40

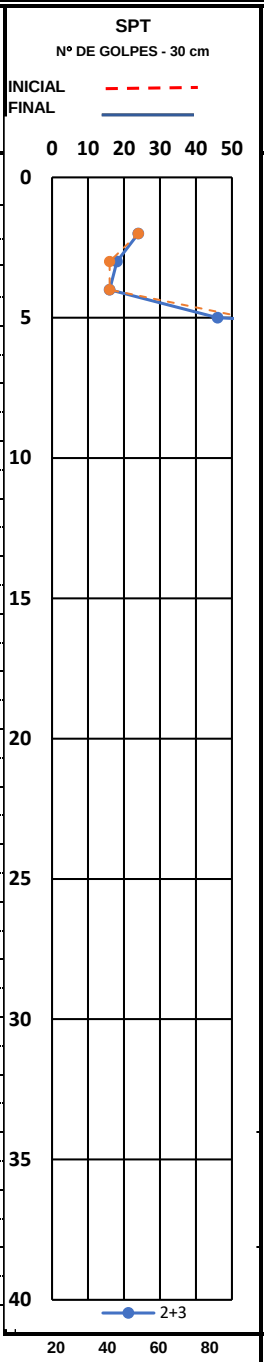

USCS	PERFIL GEOLÓGICO	INTERV. GEOLÓGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
OH		0,15	Expurgo (capim vegetal)
CH		0,16	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO
CH		3,90	ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO
		40,00	Limite da sondagem

TC - Trado Concha	AM - Amostrador
LV - Lavagem	BR - Barrilete

OBS.:

Data : 07/08/2024

SONDADOR:

Responsável Técnico:

FERNANDO SILVA DE SOUZA:01951296109

Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA DE SOUZA:01951296109
Dados: 2024.08.18 22:30:31 -04'00'
