CENTRO SOLOS CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÕES

SONDAGEM SPT

Furo	SP 06	Coord. G.Dec	N	-16.458464°	
Folha	6		O	-54.678493°	
Prof. (m):	40,00	Revst (m)	8,00	P. do Furo	4,9
Data Inicio:	07/08/2024			Data Final:	10/08/2024
N.A. Inicial:	Seco			N. A. Final:	Seco

Cliente	PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS
Obra	SONDAGEM A PERCUSSÃO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO (UPA Pedra 90)
Local	AV: ASA BRANCAL/RONDONOPOLIS - MT

Classificado por: **Labor. Robson Batista Alves**

REVESTIMENTO	AVANÇO	PENETRAÇÃO 1° 15cm	PENETRAÇÃO 2° 15cm	PENETRAÇÃO 3° 15cm	NSPT PRIMEIROS 30cm	NSPT SEGUNDO 30cm	N.A. PROFUND. (m)	PROFUNDIDADE (m)
	TC	-	-	-				1
		12	10	10	22	20		2
	AM	10	10	8	20	18		3
		8	8	8	16	16		4
	AM	16	22	27	38	49		5
		30						6
	AM							7
								8
	AM							9
								10
	AM							11
								12
	AM							13
								14
	AM							15
								16
	AM							17
								18
	AM							19
								20
	AM							21
								22
	AM							23
								24
	AM							25
								26
	AM							27
								28
	AM							29
								30
	AM							31
								32
	AM							33
								34
	AM							35
								36
	AM							37
								38
	AM							39
								40

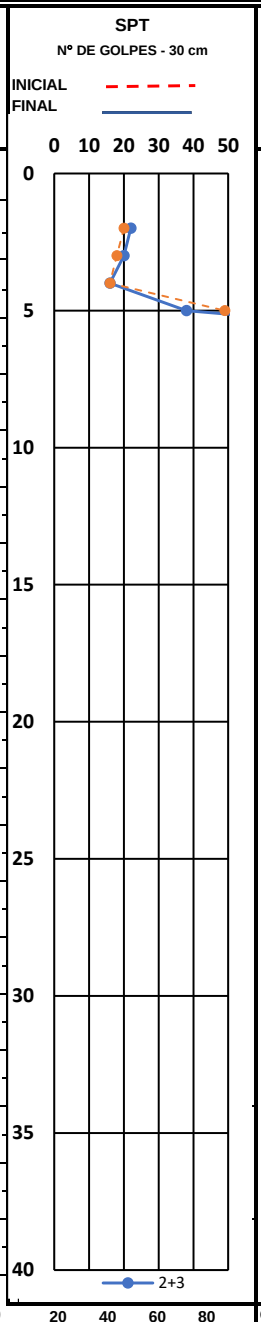

USCS	PERFIL GEOLÓGICO	INTERV. GEOLOGICO	DESCRIÇÃO GEOLÓGICA
OH		0,19	Expurgo (capim vegetal)
CH		0,20	ARGILA ARENOSA VERMELHO MUITO COMPACTO
CH		4,5	ARGILA ARENOSA VERMELHO RIJO
		40,00	Limite da sondagem

TC - Trado Concha | AM - Amostrador | ●

LV - Lavagem | BR - Barrilete

OBS.:

Data : 07/08/2024

SONDADOR:

Responsável Técnico:

FERNANDO SILVA DE SOUZA:01951296109

Assinado de forma digital por FERNANDO SILVA DE SOUZA:01951296109
Dados: 2024.08.18 22:32:08 -04'00'
